



REPORTE DE INSTALACION IXPIA

Se realizo la instalación de 22 modulos fotovoltaicos de la marca solarever.



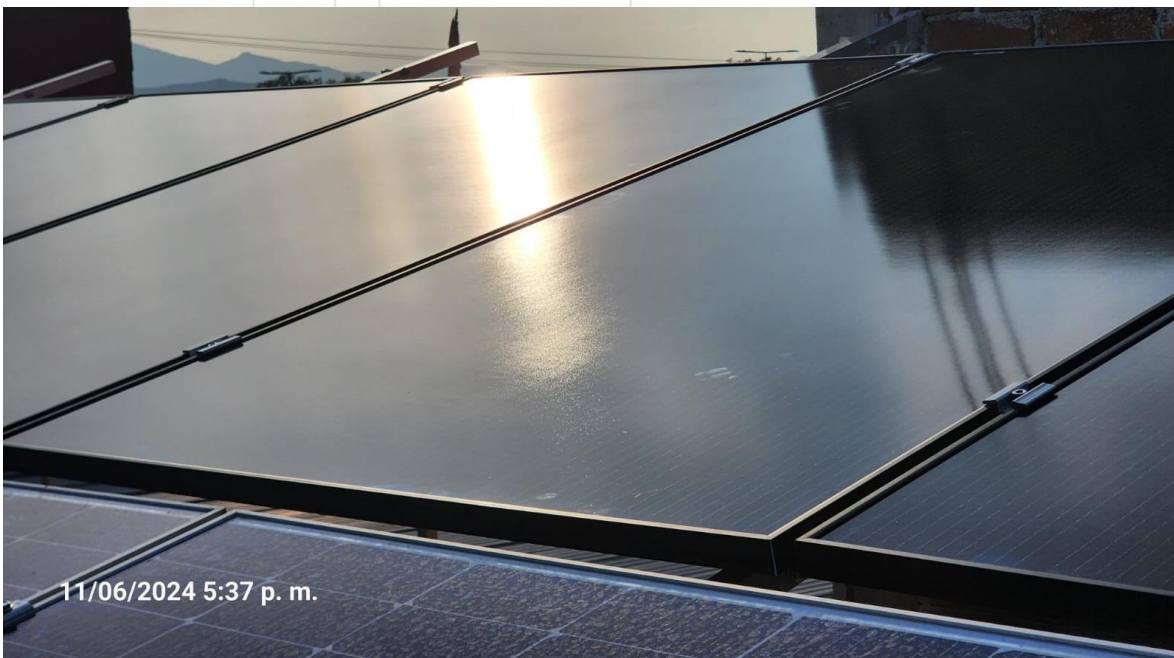

Se montaron microinversores, además se dio inicio a la conexión de corriente directa entre módulos a microinversores, y conexión entre cables troncales de microinversores. Así mismo como el montaje del centro de cargas de protecciones de corriente alterna y su respectiva conexión.

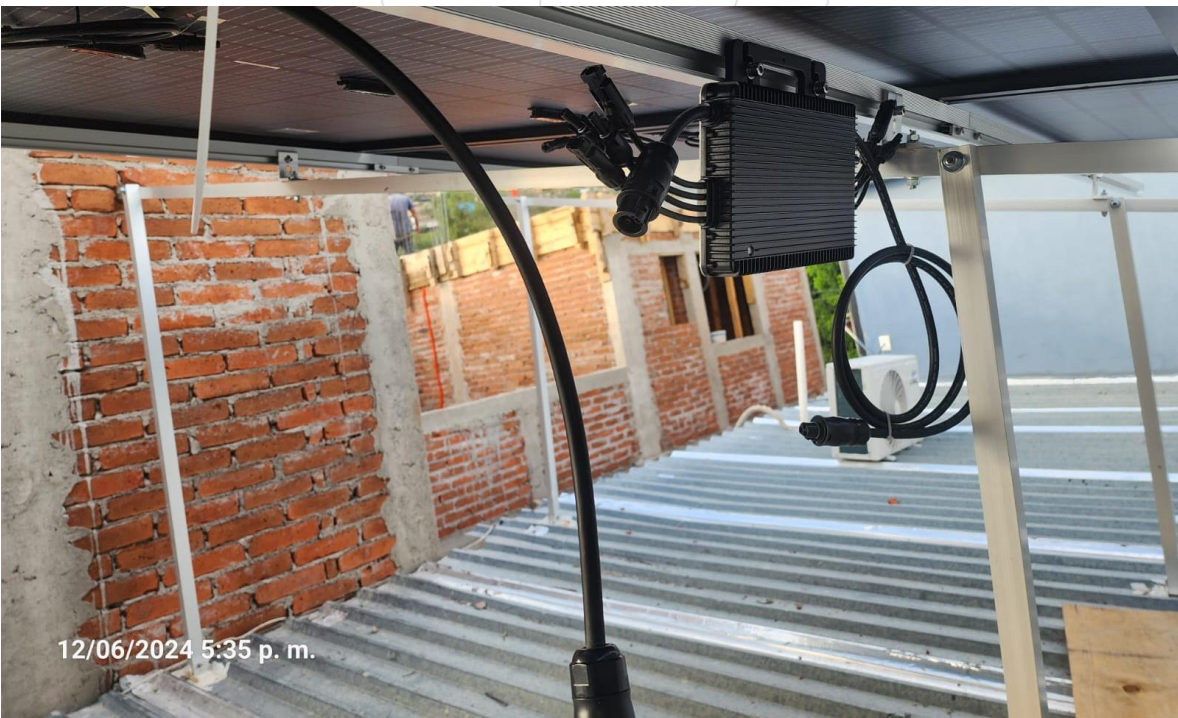









Conexión de protecciones CA.

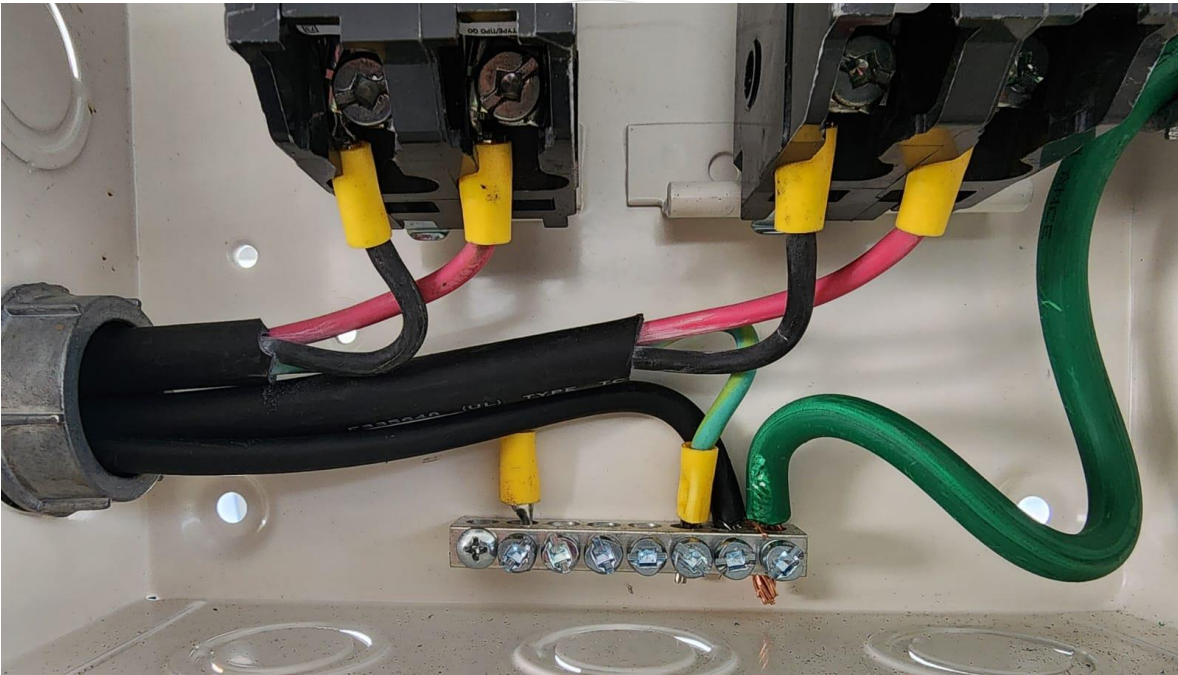

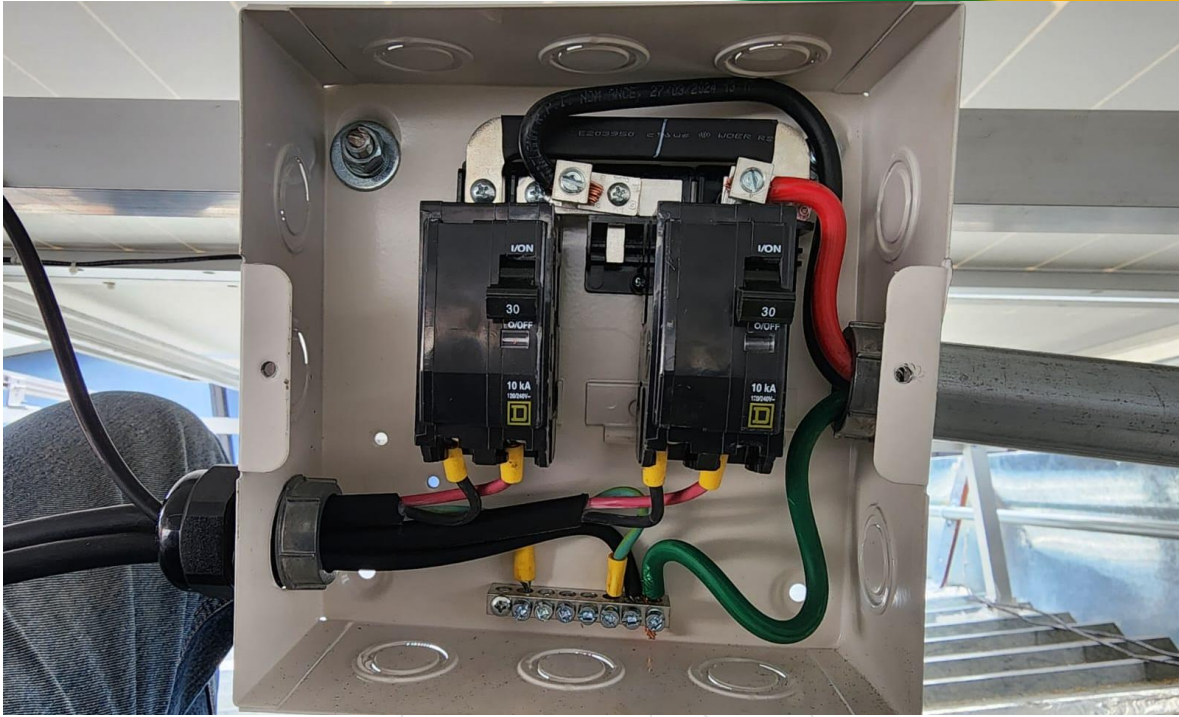

Se realizó la instalación de la tubería en corriente alterna, así como el cableado del mismo hasta el punto de interconexión del sistema.








Punto de interconexión



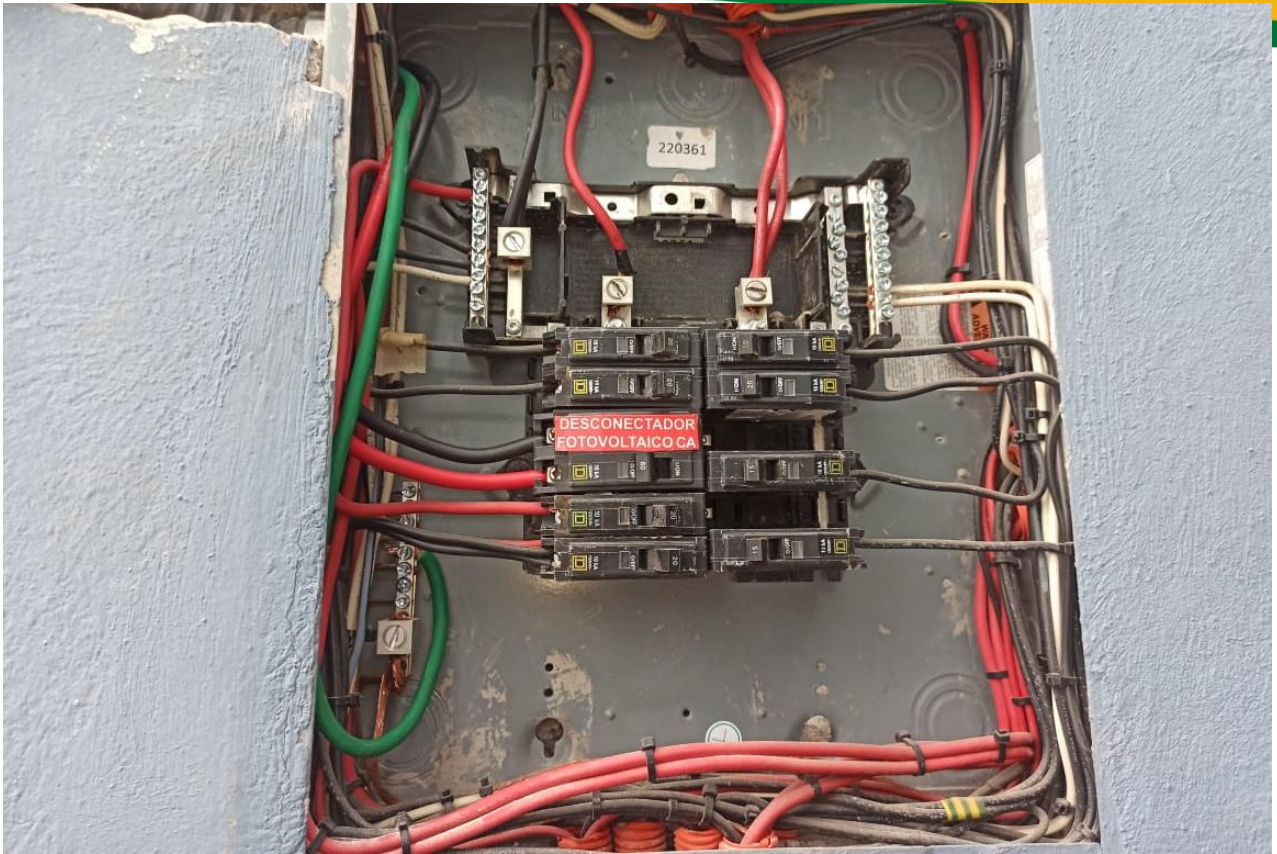

Refuerzos en los soportes de la estructura.



NOTA

Como hacen falta MC4 aun quedan pendientes la conexión de algunos modulos.

