



REPORTE DE LA INSTALACION LABORATORIO SAN FRANCISCO LINDA VISTA

La segunda estructura se comenzara a realizar en el techo de lamina que se encuentra arriba de las oficinas.

Lo primero en realizar es fijar los soportes de la estructura, debido a que los soportes son de aluminio y la lamina es de material diferente, se uso neopreno para evitar la corrosion tanto de la estructura como el de la lamina.

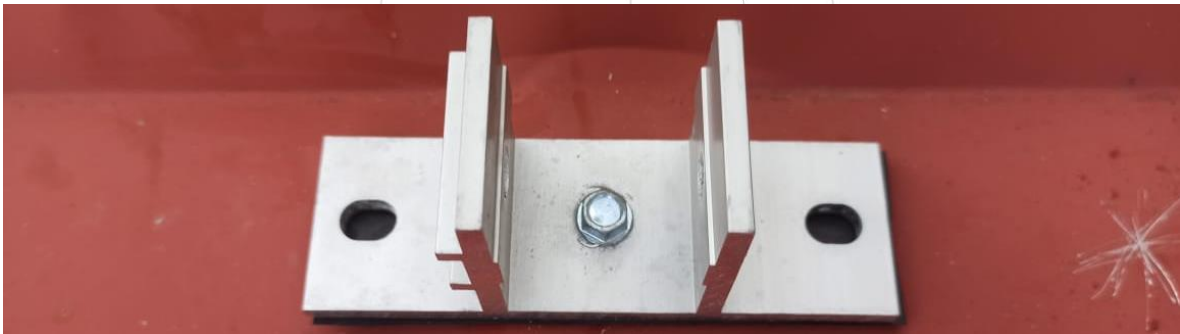

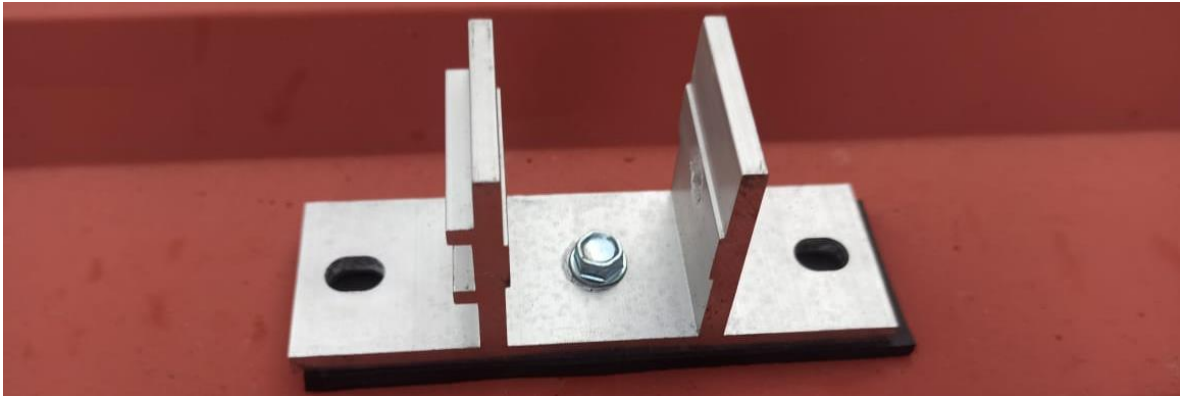

Despues de fijar los soportes se sellaron para evitar filtraciones de agua, se utilizó duretan ademas de poner impermeabilizante.





Después de fijar y sellar los soportes de la estructura, se comenzará a armar la estructura, para ello lo primero es montar el ángulo de extremo a extremo, para poder determinar la altura de las patas para la estructura.



