REPORTE SEMANAL INSTALACIÓN LABORATORIO SAN FRANCISCO

DIRECCIÓN: ARMENTA Y LOPEZ MZ35 618, DOCTOR PARDO, CENTRO U =OAXACA DE JUAREZ, OA, OAX, C.P. 68000

En esta primera semana se inició el desmontaje de los modulos colocados sobre la estructura de PTR. Hasta el momento se han desmontado 49 modulos, por lo que solo quedan pendientes 12 modulos.

01/03/2024 11:18 a. m.

01/03/2024 11:20 a. m.

Una parte de los modulos han sido resguardados adentro de las oficinas de la planta alta, los demás modulos no pudieron ser guardados adentro, ya que iban a obstruir demasiado el paso hacia las oficinas.

También todos los pedazos de plastico que tenían los modulos entre el espacio de los marcos, se ha guardado en esa oficina.

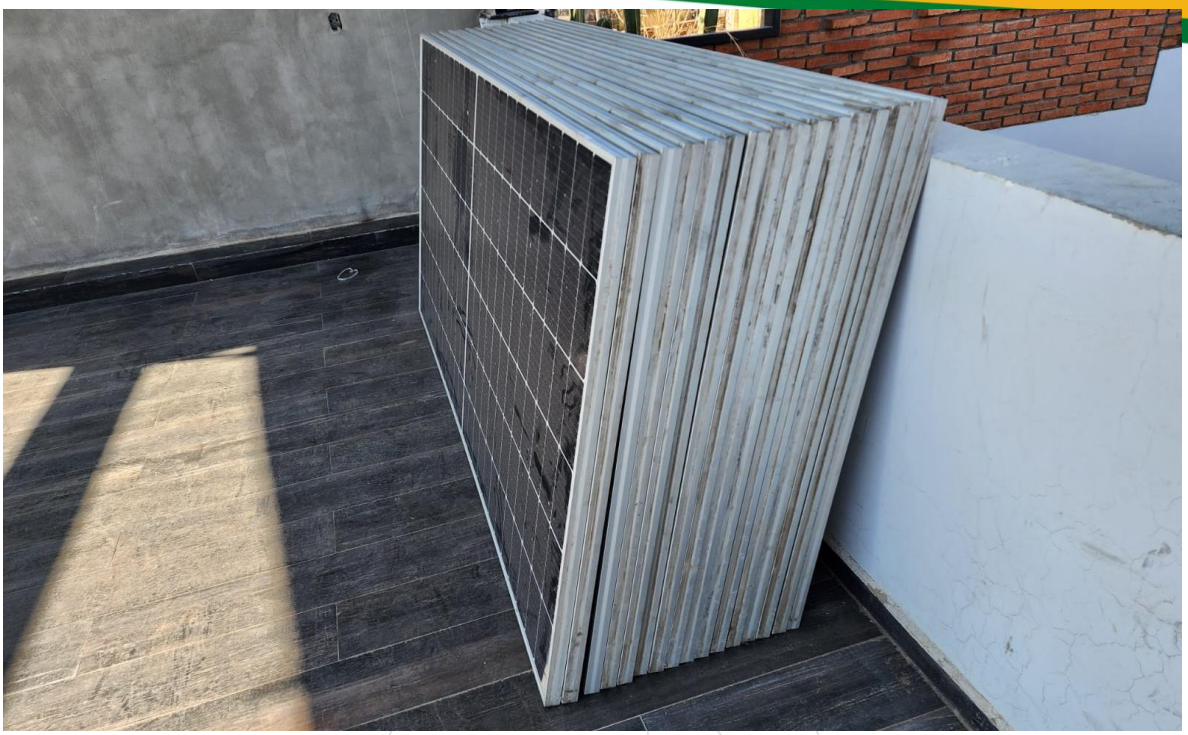

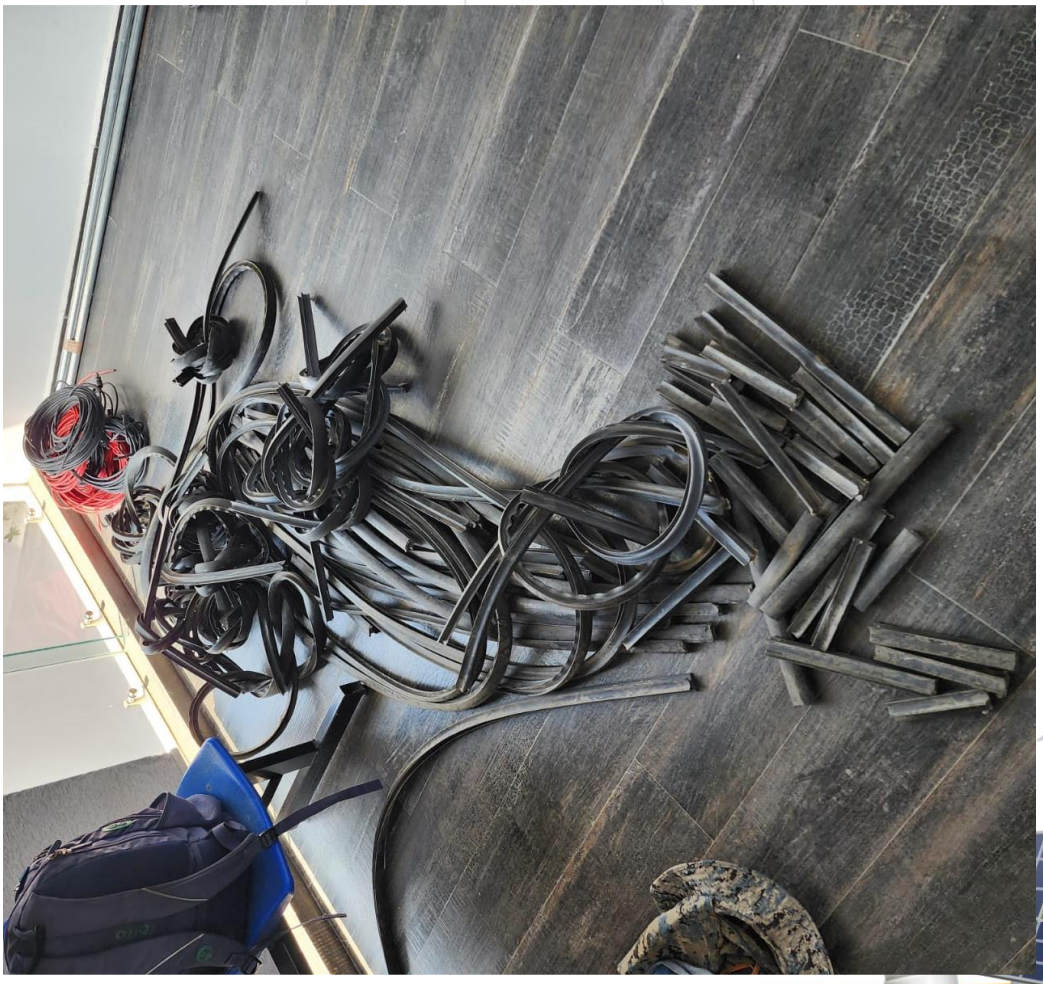

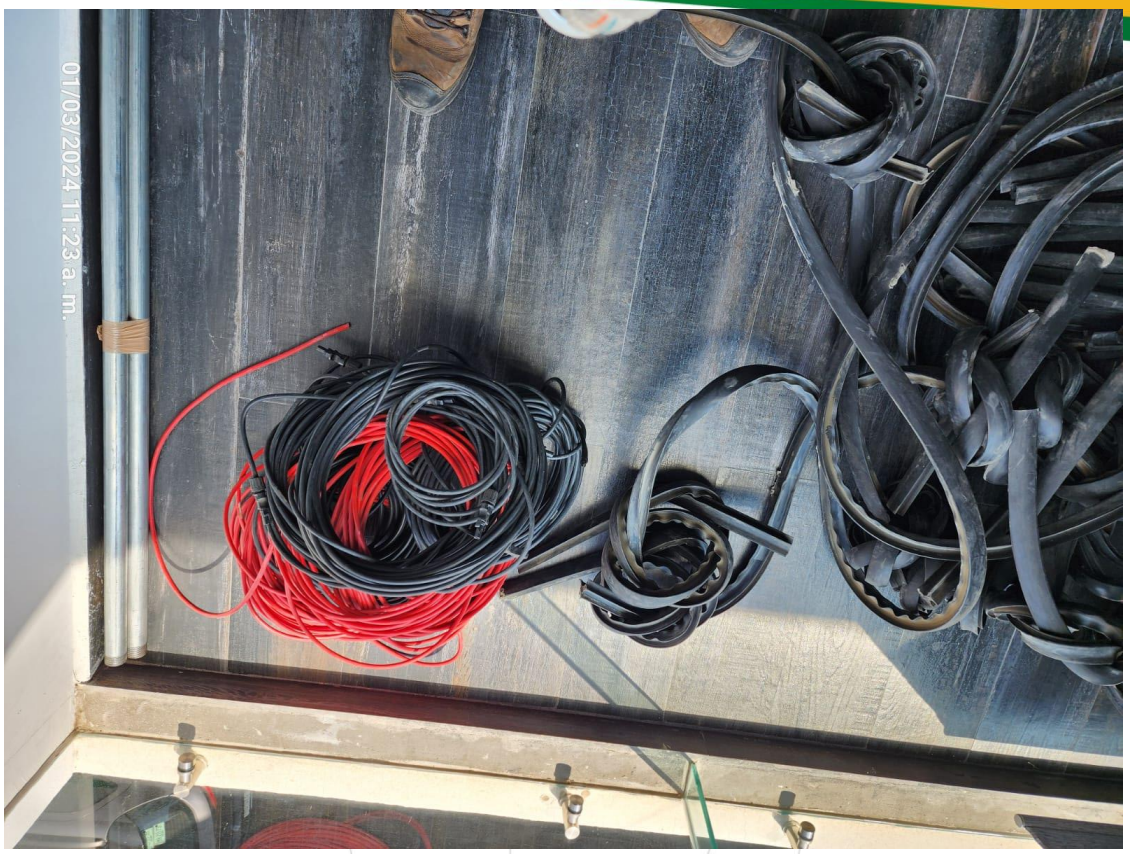

Se quitaron todos los pedazos de estructura de aluminio de montaje de los modulos, también se cortaron las pestañas que fijaban esta estructura ya que ha estado ocasionando el efecto par galvánico, el cual deteriora tanto la estructura de PTR como la de aluminio.

La estructura tiene en exceso soldadura, por lo que se ha iniciado a limar los puntos de unión ya que se ha visto que, en estos puntos la soldadura no se adhiere de manera adecuada a la pintura, por lo que comienza a oxidarse, es por ello que se limaran todos los puntos para poder pintarla de manera adecuada.

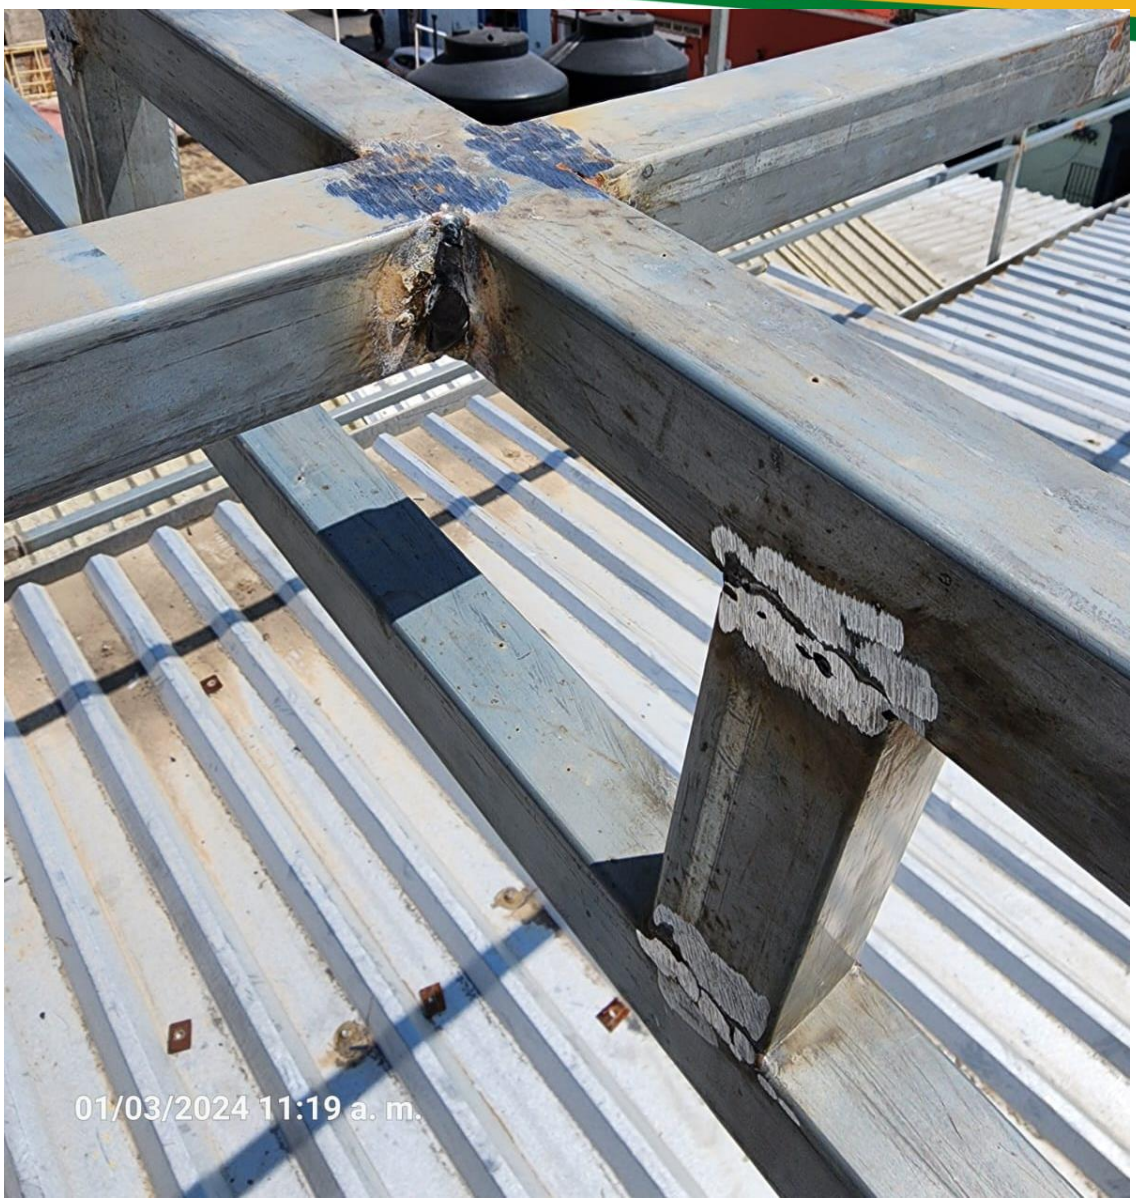
01/03/2024 11:19 a. m.
